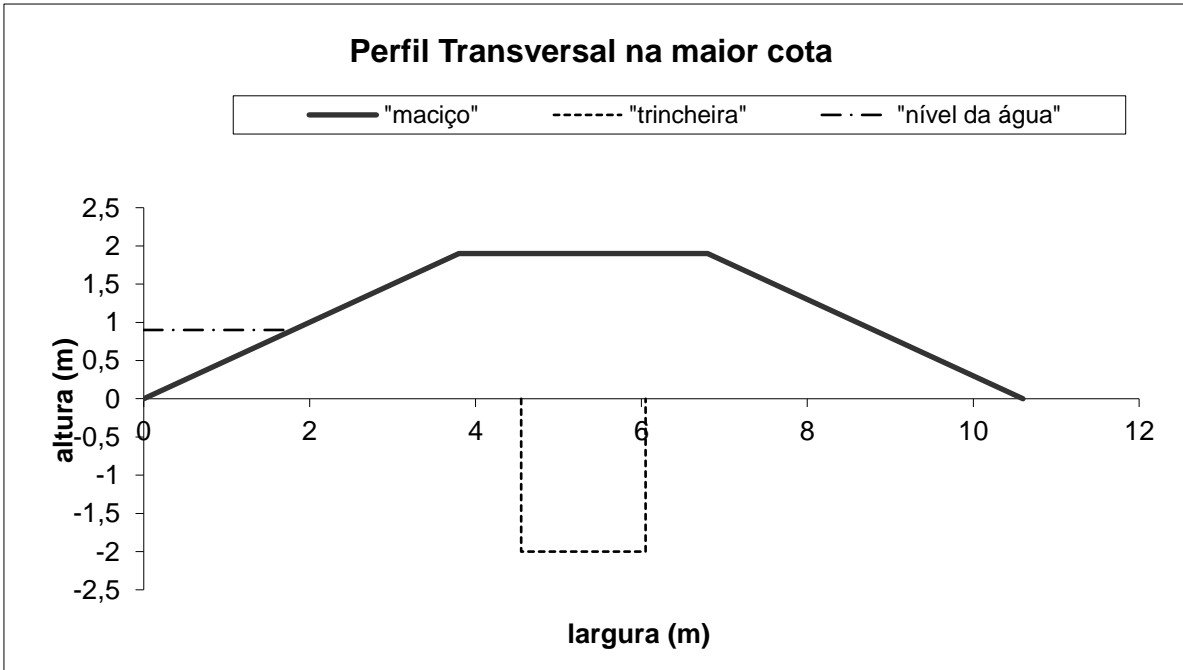


LAUDO DE FISCALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDE BARRADO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MICRO-AÇUDES BARRADO- RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE								
1.	Localização e Propriedade							
	Proprietário:	Verlei Leandro Priebe			CPF/CNPJ:	912.057.000-72		
	Endereço:	Várzea dos Cabrais	Latitude	-29	46	32,55	(°)(')(")	
	Município:	Novo Cabrais	Longitude	-52	56	31,72	(°)(')(")	
	Localidade:	Várzea dos Cabrais			Telefone:			
	Finalidade:	Execução de microaçoúde para uso de água superficial com finalidade de Irrigação de arroz						
2.	Dados do Responsável Técnico da EMATER-RS/ASCAR							
	Nome:	Lenise Raquel Mentges			CREA:	RS 179466		
3.	Dados da empresa							
	Nome:	Terra Raiz Terraplanagem			CPF/CNPJ:	-		
	Resp. Técnico:	-			CREA:	-		
4.	Dados da Obra							
	Microaçoúde Barrado							
	H - altura máxima do maciço (m)				1,90 m			
	b - largura da crista (m)				3,00 m			
	l - Comprimento do dique (m)				124,90 m			
	Inclinação do talude	Montante:		1 para: 2	Jusante:	1 para: 2		
5.	Período de Ocorrência da Obra.							
	Início: 05/04/2023			Final: 06/04/2023				
6.	Perfil do Maçoúde do Microaçoúde							
 <p style="text-align: center;">Perfil Transversal na maior cota</p> <p style="text-align: center;"> "maciço" "trincheira" "nível da água" </p>								

7. Área de Decapagem	
Área média da base do maciço:	1.072,76 m ²
Profundidade:	0,20 m
Volume de Decapagem:	214,55 m ³

8. Memória de Cálculo do Microaçoide

A seguir a tabela de volume de terra a ser compactada

Alinhamento	Distância (m)	Altura (m)	Volume (m ³)
14E-15E	0,00	0,00	
13E-14E	0,00	0,00	
12E-13E	0,00	0,00	
11E-12E	0,00	0,00	
10E-11E	0,00	0,00	
9E-10E	0,00	0,00	
8E-9E	0,00	0,00	
7E-8E	0,00	0,00	
8E-7E	0,00	0,00	
5E-6E	0,00	0,00	
4E-5E	0,00	0,00	
3E-4E	0,00	0,00	
2E-3E	9,50	0,00	170,75
1E-2E	9,20	0,70	275,90
0-1E	43,00	1,50	77,40
0	0,00	1,90	-
0-1D	42,00	1,50	75,60
1D-2D	12,20	0,70	276,94
2D-3D	9,00	0,00	176,39
3D-4D	0,00	0,00	
4D-5D	0,00	0,00	
5D-6D	0,00	0,00	
6D-7D	0,00	0,00	
7D-8D	0,00	0,00	
8D-9D	0,00	0,00	
9D-10D	0,00	0,00	
10D-11D	0,00	0,00	
11D-12D	0,00	0,00	
12D-13D	0,00	0,00	
13D-14D	0,00	0,00	
14D-15D	0,00	0,00	
Soma	0,00		1.052,99

9. Quadro de movimentação de terra para formação do maciço:

Operação	Movimentação de terra		
	Retirada (m ³)	Compactada (m ³)	Transportada (m ³)
Decapagem	214,55		
Trincheira	234,41	234,41	
Maciço		1.052,99	
Totais	448,96	1.287,39	1.544,87

Relatório fotográfico




Foto 1 - Local onde será construído o microaçude (antes da realização da obra)

Data que foi obtida a imagem: 02/03/2022



Foto 2 – Execução dos trabalhos de construção do microaçude (final da realização da obra)

Data que foi obtida a imagem: 12/04/2023

10.	Atestado					
	Data da vistoria: 06/04/2023					
	Na data acima citada foi realizada a vistoria por este técnico da EMATER-RS/ASCAR, responsável pela fiscalização da obra da construção do micro açude.					
	Para tanto, atesto para os devidos fins que a empresa antes citada, contratada através de instrumento contratual sob referência, de acordo com os procedimentos especificados em termo de referência do edital público, e ainda com base no constante em projeto apresentado pela EMATER/RS - ASCAR:					
	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Executou os serviços contratados.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Executou parcialmente os serviços contratados.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Não executou os serviços contratados satisfatoriamente.</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Executou os serviços contratados.	<input type="checkbox"/>	Executou parcialmente os serviços contratados.	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Executou os serviços contratados.					
<input type="checkbox"/>	Executou parcialmente os serviços contratados.					
<input type="checkbox"/>	Não executou os serviços contratados satisfatoriamente.					
11.	<p>Local e data: Novo Cabrais/RS, 16 de junho de 2023</p> <p>Nome do Responsável Técnico: Lenise Raquel Mentges</p> <p>CREA: RS 179466</p> <p></p> <p>Assinatura</p> <p>LENISE RAQUEL MENTGES ERNBI - Agropecuária Engenheira Agrônoma CREA RS 179466 Ascar-Emater/RS</p>					
